

ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES DU 19 Février 2015



LE CANAL DE L'ISLE EN RESUME (Fin 2014)

- Conseil d'Administration :
 - 11 Syndics Titulaires
 - 5 Syndics Suppléants
- Nombre d'employés : 9
- Nombre de propriétaires : 2.700
- Surface du périmètre syndical :
 - 3.240 ha pour 4.000 dominés
- Dotation EDF de l'Association :
 - 54.000.000 m³
- Volume prélevé pour 2014 : 19 Mm³
- BP Fonctionnement 2014 : 1.014 K€
- Réseau gravitaire :
 - 945 hectares
 - 1.220 propriétaires
 - 23 filioles pour un linéaire de 51 kms
 - 198 hectares irrigués
 - 17.500.000 m³ de prélevés pour 2014
- Réseau modernisé pression :
 - 2.291 hectares
 - 1.496 propriétaires
 - 6 stations de pompage
 - 5 Bassins de 3.000 à 15.000 M³
 - 1101 bornes agricoles
 - 933 bornes d'agréments
 - 220 kms de canalisations (de O 40 à 1000)
 - 2.500.000 m³ de prélevés pour 2014

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION

- 1. COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER**
- 2. PRESENTATION DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT**
- 3. AVANCEMENT DU CONTRAT DE CANAL**
- 4. QUESTIONS DIVERSES**

COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2013

Recettes section de fonctionnement

- Participation des autres associations, location et remb. Indemn.....	26.956 €
- Recouvrement des taxes.....	937.309 €
- Recouvrement sur sinistres et autres participations sur travaux.....	18.736 €
- Subvention du Département (fond départemental, annuités emprunts)	34.637 €
- Subvention Agence de l'eau + Feder (contrat canal).....	21.618 €
- Participation pour économie d'eau.....	73.073 €

TOTAL DES RECETTES **1.112.329 €**

- Excédent reporté.....	563.112 €
-------------------------	-----------

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2013

Section d'Investissement

- Le montant des dépenses s'élève à 805.036 €.

Le Canal de l'Isle continue d'investir de manière régulière, cela reste indispensable pour assurer le devenir de la desserte en eau avec des ouvrages pérennes et performants.


- Les recettes s'élèvent quant à elle à 1.065.378 € dont 51 % pour des subventions attribuées par nos partenaires financiers que sont le Département de Vaucluse, l'Agence de l'eau, la Région PACA et le FEADER, pour la réalisation de notre programme de travaux et d'études.

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2013

	Recettes (€)	Dépenses (€)	Résultat (€)
Fonctionnement	1.675.442	943.058	732.384
Investissement	1.065.378	805.036	260.342
Restes à réaliser	458.330	777.478	-319.148
	Report de fonctionnement au 31/12/2013		+ 673.578

Les travaux d'investissement réalisés nécessitent de contracter des emprunts pour la part d'autofinancement. Le poids de la dette du canal ne bénéficiant pas d'aide extérieure représente fin 2013 un montant de 672.334€, les annuités d'emprunts correspondantes quant à elles représentent pour 2013 à un montant en intérêts + capital de 88.893 € soit 8% des recettes de fonctionnement hors report.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

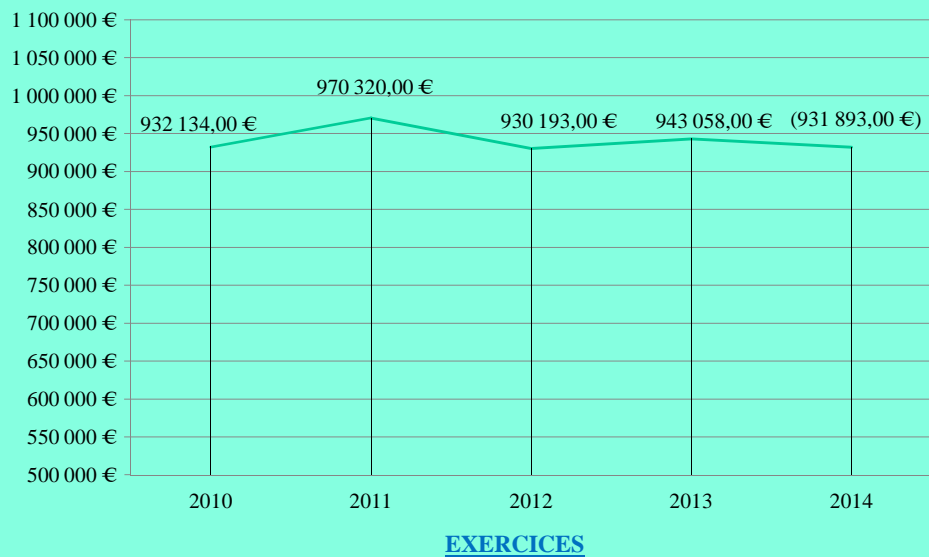

BILAN DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

Secteur Arrousaire
(COMMUNES de Lagnes et Isle)
4ème Tranche de travaux

1^{er} Lot : Modernisation du Réseau : Travaux attribués au Groupement SNPR-BRIES

Secteur 1 – commune de Lagnes (Or Font-iou-mas, ramereil et souvillier)

- Pose de 3.700ml de canalisations (Ø 200 à 50)
- Réalisation de 34 branchements

Secteur 2 – commune de l'Isle sur la sorgue (Or St gervais)

- Pose de la conduite de transfert en Ø 400 sur 290ml et Ø 350 sur 300ml.

Montant réalisé H.T. 454.600 €



TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

Secteur Arrousaire
(COMMUNES de Lagnes et Isle)

4ème Tranche de travaux

2ème Lot : Couverture de la station de pompage : Travaux attribués à l'Ent. VERNIER-ALASSAIRE

- Construction d'un bâtiment de 8 m X 11 m englobant les pompes et l'antibélier.
- Ce lot a pris du retard compte tenu de la qualité du sol incompatible en l'état pour la construction d'un tel bâtiment. Nous avons réaliser une étude de sol ainsi qu'une étude béton dont il est ressorti qu'il était nécessaire d'effectuer des pieux béton pour soutenir la structure.

MONTANT PREVISIONNEL 90.000 € HT



TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Caramede
(COMMUNE de Robion)

2ème Tranche de travaux

(Secteur Le Vas)

Modernisation du Réseau sur un secteur de 75 Has :

Travaux en cours de finalisation:

- La station de refoulement 80l/s à 40 M est quasiment terminée
- Remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de compteurs : 35 U
- Construction du local abritant la station
- Le financement est pris en charge à
 - 30% pour la Région PACA
 - 30% pour l'Agence de l'eau
 - 20 % pour le Département de Vaucluse
 - 20 % d'autofinancement



Le montant global de ce programme s'élève à 280.000 € HT

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Arrousaire
(COMMUNE de L'Isle)
5ème Tranche de travaux

Modernisation du Réseau : Travaux attribués au Groupement SNPR-BRIES

commune de l'Isle sur la sorgue (Qr St gervais)

- Pose de la conduite de transfert en Ø 350 sur 410ml et Ø 300 sur 690ml.
- Pose de 3.600ml de canalisations (Ø 200 à 110)
- Réalisation de 41 branchements

Montant du marché H.T. 542.000 €



TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Arrousaire

(COMMUNE de Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES

STATION DE POMPAGE : Travaux attribués à l'Ent. MICHELIER

- Remplacement du débitmètre
- D'une pompe de 200l/s à 70 HMT
- Remplacement de l'armoire de commande et d'alimentation

MONTANT DU MARCHÉ : 132.402 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Arrousaire

(COMMUNE de Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES

REPLACEMENT DE VANNES D'ISOLEMENT DU BASSIN : Travaux attribués à l'Ent. BERNARAS

- Remplacement de RV Ø 1000, 600 et 500 avec option motorisation sur le RV 1000.

MONTANT DU MARCHE : 98.975 €



Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Moutillon

(COMMUNE de Robion)

RETROCESSION DES OUVRAGES

STATION DE POMPAGE : Travaux attribués à l'Ent. VERNIER-ALASSAIRE

- Construction du local abritant la station

MONTANT HT du marché 37.328 €



Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PREVUS POUR 2015/2016

Secteurs Moutillon et Arrousaire

(Communes de Robion et Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES

RESEAU DE DESSERTTE :

- Changement de Vannes de sectionnement (Ø 500 à 160)
- Sécurisation du réseau

MONTANT HT du marché 200.000 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PREVUS POUR 2015/2016

MODERNISATION DES OUVRAGES

Secteur Arrousaire (Commune de l'Isle sur la Sorgue)

- Modernisation des quartiers la muscadelle et le petit palais

Secteur Caramede 3 (Communes de Robion et Lagnes)

- Modernisation du nord des quartiers du vas et des oupiolles et le chemin de la Fourmilière

Régulation du canal maitre

- Pose d'une vanne déversante et d'appareillage de mesure

Financement des travaux :

FEADER – CG84 – REGION PACA – AGENCE DE L'EAU – CANAL DE L'ISLE

ETUDES FINALISEES EN 2014

- **Rendu de l'étude de la régulation du Canal**
- **Etude phytosanitaire**

Contrat de Canal de l'Isle

Point en AO – 19/2/2015

Zoom sur quelques actions réalisées

- Sécurisation d'ouvrages dangereux
- Etude sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires
- Convention de transfert de gestion de la filiole 14
- Opérations de régulation
- Bilan mi-parcours 2012-2014 et révision 2015-2017 du Contrat de Canal

Sécurisation d'ouvrages dangereux

- 2 secteurs identifiés :
 - Buse Petit Palais
 - Siphon lieu dit Longchamp (le Thor)
- Budget 25 000 €
- Travaux cofinancés par l'Agence de l'Eau, le Conseil Régional et le Conseil Général

Secteur Petit Palais Avant



Pendant



Lieu dit Longchamp – Le Thor avant



Etude sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires

- Objectif pour le canal:
 - Anticipation des changements réglementaires:
 - Code de l'environnement: stockage et usage,
 - Loi Labbé: interdiction 2020 au mieux, 2016 au pire
 - Rechercher des techniques alternatives
 - Assurer une transition vers du « zéro phyto » dans de bonnes conditions
 - Financières
 - Sur le terrain
 - Meilleure connaissance de la qualité de l'eau

Résultats

- Techniques alternatives: 0
- Qualité de l'eau: bon résultats,
 - pas de pollution chronique
 - Bonne qualité de l'eau sur l'ensemble des paramètres classiques de qualité d'eau de rivière
- Transition vers le zéro phyto:
 - Transition en 2 ans
 - Surcoût compensé par la disparition du linéaire de filioles

Lagnes – transfert de gestion de la

F14

- Rôle d'évacuation des eaux pluviales joué par la filiole
- Travaux de mise sous pression en début 2014
- Conventionnement avec la mairie pour la continuité du rôle d'évacuation du pluvial



Opérations de régulation

- Finalisation de l'étude de modernisation de la régulation
- Mise en œuvre du programme de régulation:
 - Utilisation de fonds européens FEADER
 - 3 tranches prévues:
 - Changement de la vanne de prise et pose de nouveaux points de mesure
 - Pose d'un seuil oblique à Reydet
 - Utilisation du bassin de peyreras comme un bassin tampon



Bilan mi-parcours

- Limitation dans le temps des financements du Conseil Régional
- Montée en puissance de l'utilisation des fonds européens FEADER
- Initialement envisagé sous la forme d'une prestation
- Réalisé en interne suite à décision du Comité technique de Juillet 2014
- Besoin de réactualiser le programme 2015-2017

Bilan mi-parcours 2012-2014

	Prévu	Réalisé
2012	840 000 €	880 000 €
<i>Volet I</i>	<i>840 000 €</i>	<i>880 000 €</i>
2013	1 075 000 €	195 000 €
<i>Volet I</i>	<i>880 000 €</i>	
<i>Volet V</i>	<i>195 000 €</i>	<i>195 000 €</i>
2014	708 000 €	25 000 €
<i>Volet I</i>	<i>705 000 €</i>	
<i>Volet V</i>	<i>3 000 €</i>	<i>25 000 €</i>
TOTAL	2 623 000 €	1 100 000 €

- Difficultés à obtenir un prêt pour la part d'autofinancement en 2011 et 2012: révision du planning pour 2 opérations majeures.
- Prévu pour le chômage 2011-2012, elles ont été réalisées en :
 - 2012-2013 pour caramède tranche 1
 - 2013-2014 pour arrousaire tranche 4
- Le canal de l'Isle n'a pas fait de demandes de subventions en 2013 et 2014 et décalé d'autres opérations initialement prévues au delà

Révision du programme 2015-2017

	2015	2016	2017	Total
Montant des Actions prévues à la signature	680 000 €	1 030 000 €	831 000 €	2 541 000 €
Montant du programme d'actions réactualisé	950 000 €	920 000 €	630 000 €	2 500 000 €
Evolution	+ 40 %	- 11%	- 24%	-2%

- Reprogrammation des actions en retard suite aux difficultés d'accès au crédit en 2011-2012.
- Mise sous pression du secteur Velorgues repoussée à un avenant au delà de 2017
- Des crédits ont été libérés pour la mise en œuvre d'actions de régulation sur le canal maître
- Poursuite de la programmation initiale sur les autres axes

Et après...

- Tous les documents sont consultables sur le site internet du canal:

→ **www.canal-isle.fr**

→ Taper « canal de l'Isle » sur un moteur de recherche très connu...

